


ASEMAPIIRROS ve pihat

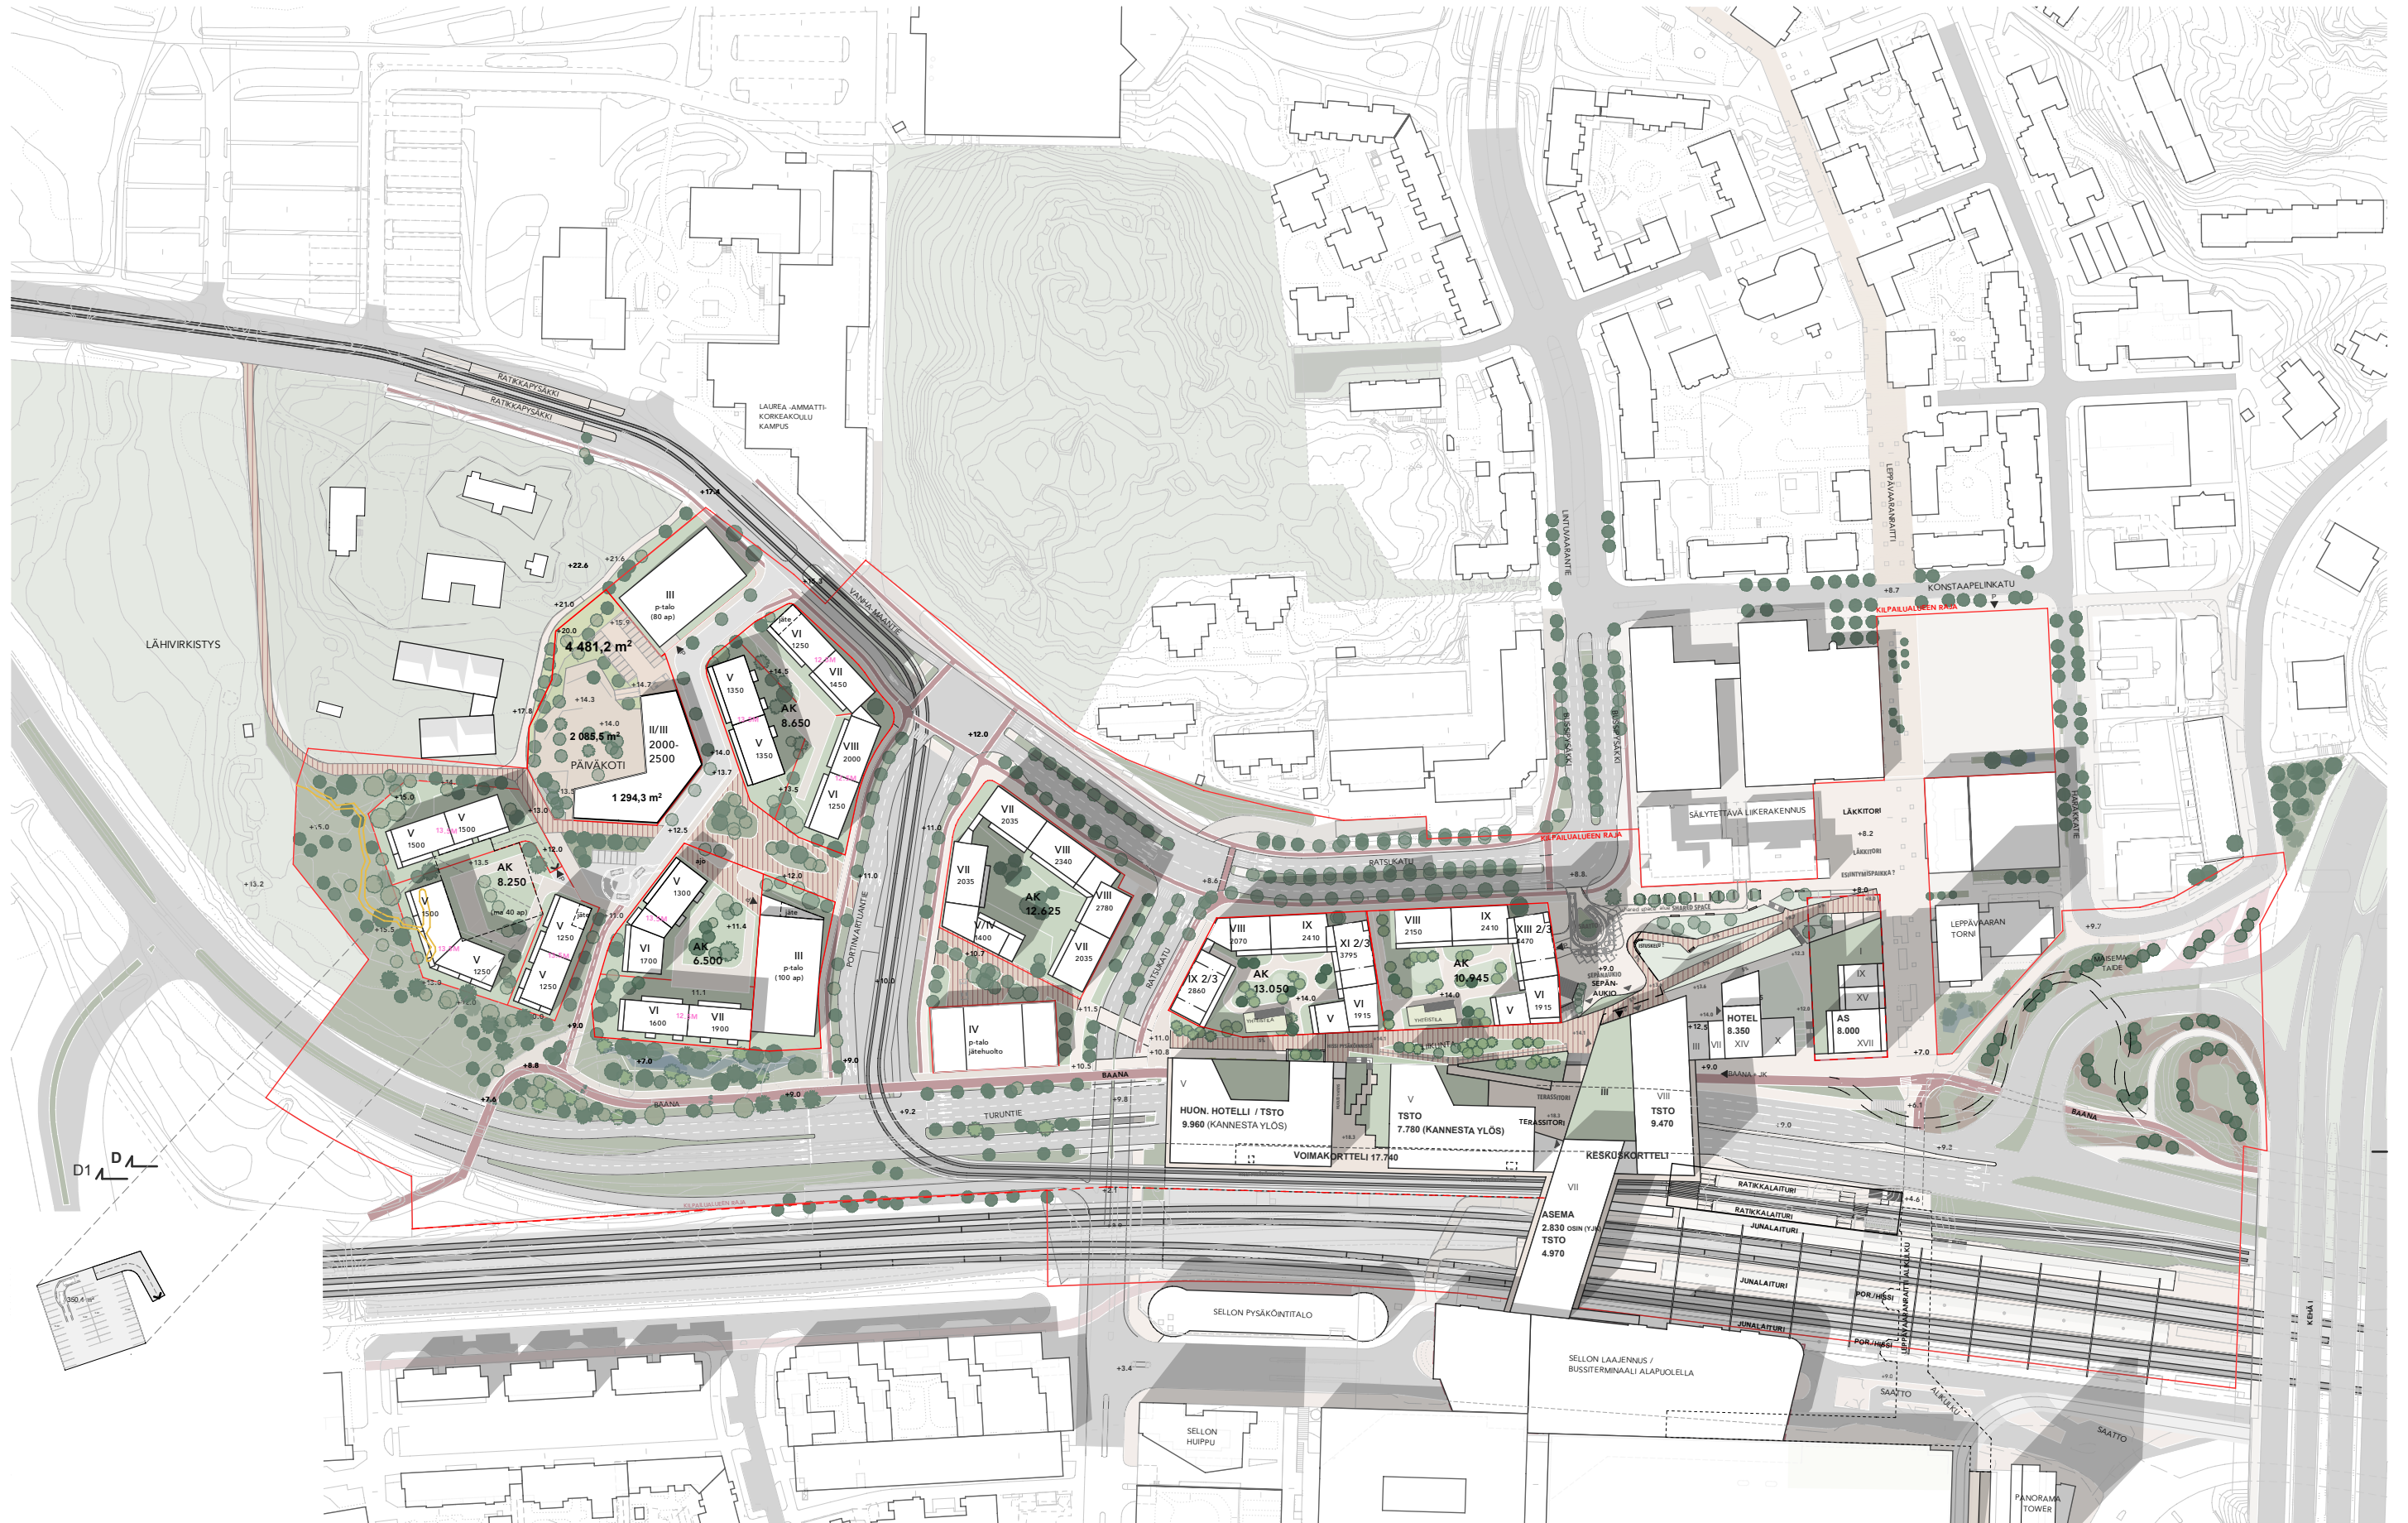

Toimenpide	Toimenpiteen tarkennus	Arvio ajankohdasta		Hinta-arvio (€) 0% alv	Toteuma	Jäljellä	Alkup. Hinta-arvio 0% alv	Vastuutaho					
		Aloitus	Lopetus					Hanke		Espoo		Muu	
								Osuus (%)	Osuus (€)	Osuus (%)	Osuus (€)	Osuus (%)	Osuus (€)
Luontoselvitys Perus	Liito-orava, luontotyypit...	huhti.25	loka.25	7 071	7 071	0	7 240	100,0 %	7 071	0,0 %	0	0,0 %	0
Luontoselvitys Lepakko	Lepakkohavainnot	huhti.25	loka.25	1 217	1 217	0	1 080	100,0 %	1 217	0,0 %	0	0,0 %	0
Luontoselvitys, optio Lepakko	Lepakko	kesä.25	syys.25	0	0	0	4 145	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Luontoselvitys, optio Linnut	Pesimälinnustoselvitys	kesä.25	syys.25	0	0	0	0	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Hulevesiselvitys	Tulvariski, reitit...	joulu.25	kesä.26	0	0	0	10 000	0,0 %	0	100,0 %	30 000	0,0 %	0
Julkisen taiteen selvitys		huhti.26	kesä.26	2 000	0	2 000	2 000	100,0 %	2 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Rakennushistoriaselvitys	Terveyskeskus	huhti.26	kesä.26	4 000	0	4 000	4 000	100,0 %	4 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Muinaisjäännesselvitys	Gransinmäki	huhti.26	kesä.26	5 000	0	5 000	5 000	100,0 %	5 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Meluselvitys	Raide- ja tieliikenne, yleinen ja alustava	huhti.26	marras.26	40 000	0	40 000	40 000	100,0 %	40 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Tärinäselvitys	Raitiotie- ja rata liikenne	kesä.26	loka.26	20 000	0	20 000	20 000	100,0 %	20 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Liikenne-ennuste	Liikenneennuste ja toimituustarkastelut	elo.25	joulu.25	18 075	18 075	0	0	100,0 %	18 075	0,0 %	0	0,0 %	0
Liikennesuunnittelu	Ajoneuvo, pysäköinti, pelastus ja huolto	elo.25	joulu.26	80 000	25 118	54 883	0	100,0 %	80 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Ramboll-projektinjohto	Suunnittelun koordinointi	touko.25	joulu.26	20 000	10 670	9 330	0	100,0 %	20 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Tunneli	Kansi- ja siltarakenteen tarkastelua	elo.25	loka.26	52 000	12 776	39 224	170 000	100,0 %	52 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Rata-alueen rakennusselvitys	Väylä edellyttää hankkeelle rata- asiantuntiaa	syys.25	kesä.26	20 000	2 138	17 863	20 000	100,0 %	20 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Kaupalliset vaikutukset		syys.25	joulu.25	0	0	0	10 000	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Ilmanlaatuselvitys		kesä.26	syys.26	5 000	0	5 000	5 000	100,0 %	5 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Tuulisuusselvitys	alustava, tarkentuu korttelikohtaisesti	touko.26	marras.26	10 000	0	10 000	10 000	100,0 %	10 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Alueen energiaselvitys	Koonti mahdollisuuksista	touko.26	heinä.26	5 000	0	5 000	5 000	100,0 %	5 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Vähähiilisyysarviointi	Ilmastovaikutustenarviointi	elo.26	loka.26	2 000	0	2 000	8 000	100,0 %	2 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Rakennettavuusselvitys	Eryisrakenteet	touko.26	loka.26	30 000	0	30 000	30 000	100,0 %	30 000	0,0 %	0	0,0 %	0
PIMA-selvitys	Historiaselvitys ja vanhat raportit	touko.26	elo.26	25 000	0	25 000	80 000	100,0 %	25 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Arco - kaava-suunnittelu		tammi.25	helmi.27	0	0	0	385 719	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Arco - Korttelisuunnitelma		touko.26	helmi.27	140 000	0	140 000	0	100,0 %	140 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Arco - Lähiympäristösuunnitelma		touko.26	helmi.27	56 000	0	56 000	0	100,0 %	56 000	0,0 %	0	0,0 %	0
Arco - luonnosuunnittelu		tammi.25	huhti.26	189 719	125 133	64 586	0	100,0 %	189 719	0,0 %	0	0,0 %	0
KTYS	Kunnallistekniikan yleissuunnitelma	kesä.26	kesä.27	180 000	0	180 000	450 000	40,0 %	180 000	40,0 %	180 000	20,0 %	90 000
Yhteensä (€)				912 082	202 198	709 884	1 267 184		912 082		210 000		90 000
€/kaavoitettu k-m2				7,9			10,9		7,9		1,8		0,8
